



CNPJ
47.727.700/0001-46

Razão Social
EDIFIQUE CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia
EDIFIQUE
EMPREENDIMENTOS

MALHADA DOS BOIS/SE, 09 DE MARÇO DE 2026.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE

ASSUNTO: **BOLETIM DE MEDIÇÃO n.º 06** - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

A EMPRESA EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N.º:
47.727.700/0001-46, com endereço à Rua São José n.º 55 – Malhada dos Bois/Se, vem
através desta encaminhar o **Boletim de Medição N.º 06** – referente aos serviços de
"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT
59/2025 PMGC".

Valor dos Serviços: **R\$ 166.165,32** (CENTO E SESENTA E SEIS MIL, CENTO E SESENTA E CINCO
REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Atenciosamente.

José Sérgio
da Silva Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho
Dados: 2026.03.09
08:24:29 -03'00'

JOSÉ SÉRGIO DA SILVA FILHO
CPF nº 027.491.855-21
Representante Legal/Procurador

CONTA PARA DEPOSITO:
AGENCIA: 2448 / OPERAÇÃO: 003 / CONTA N.º: 2901-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

✉ edifiqueempreendimetosse@gmail.com
📍 Rua São José, 55 - Centro
Malhada dos Bois | SE | 49.940-000

EDIFIQUE
EMPREENDIMENTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

EDIFÍQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC



CNPJ: 47.727.700/0001-46
 PERÍODO: 24/12/2025 A 09/03/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 09/03/2026

| ITEM | SERVIÇOS | UND | QTD | QUANTIDADES | | | VALOR UNIT | CONTRATO | VALORES | | | SALDO | |
|---------------------------|--|-----|----------|--------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------|-------|
| | | | | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | | | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | | |
| 05.002.008 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 15,00 | 8,00 | 7,00 | 15 | R\$ 563,74 | R\$ 8.306,10 | R\$ 4.429,92 | R\$ 3.876,18 | R\$ 8.306,10 | R\$ - | 0,00% |
| 05.003 | SINALIZAÇÃO | | | | 0 | 0 | | R\$ 4.477,74 | R\$ - | R\$ 4.477,74 | R\$ 4.477,74 | R\$ - | 0,00% |
| 05.003.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dhnt, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 3,00 | - | 3,00 | 3 | R\$ 750,53 | R\$ 2.251,59 | R\$ - | R\$ 2.251,59 | R\$ 2.251,59 | R\$ - | 0,00% |
| 05.003.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dhnt diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 3,00 | - | 3,00 | 3 | R\$ 742,05 | R\$ 2.226,15 | R\$ - | R\$ 2.226,15 | R\$ 2.226,15 | R\$ - | 0,00% |
| 06 | MARCO INAUGURAL | | | | 0 | 0 | | R\$ 3.309,14 | R\$ - | R\$ 3.309,14 | R\$ 3.309,14 | R\$ - | 0,00% |
| 06.001 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0,28 | - | 0,28 | 0,28 | R\$ 2.921,01 | R\$ 817,88 | R\$ - | R\$ 817,88 | R\$ 817,88 | R\$ - | 0,00% |
| 06.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1,00 | - | 1,00 | 1 | R\$ 2.491,26 | R\$ 2.491,26 | R\$ - | R\$ 2.491,26 | R\$ 2.491,26 | R\$ - | 0,00% |
| 07 | SERVIÇOS FINAIS | | | | 0 | 0 | | R\$ 21.525,26 | R\$ - | R\$ 21.525,26 | R\$ 21.525,26 | R\$ - | 0,00% |
| 07.001 | Pintura de mão fio (calação) | m | 1.434,06 | - | 1.434,06 | 1434,06 | R\$ 5,11 | R\$ 7.328,05 | R\$ - | R\$ 7.328,05 | R\$ 7.328,05 | R\$ - | 0,00% |
| 07.002 | Limpeza geral | m2 | 5.162,62 | - | 5.162,62 | 5162,62 | R\$ 2,75 | R\$ 14.197,21 | R\$ - | R\$ 14.197,21 | R\$ 14.197,21 | R\$ - | 0,00% |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | | R\$ 790.188,13 | R\$ 624.022,81 | R\$ 166.165,32 | R\$ 790.188,13 | R\$ - | 0,00% |

Assinado de forma digital
 por José Sérgio da Silva
 Filho
 Dados: 2026.03.09 08:19:13
 -03'00

Assinado de forma digital
 por José Sérgio da Silva
 Filho
 Dados: 2026.03.09 08:19:13
 -03'00

José Pereira de Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SP/71404344-5

MEMÓRIA DE CÁLCULO 06

EDIFÍQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

CNPJ: 47.727.700/0001-46
 PERÍODO: 24/12/2025 A 09/03/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 09/03/2026



| ITEM | CONTRATO | | | QUANTIDADES | | | VALORES | | | |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------|------------|-------------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------|
| | SERVIÇOS | UND | QTD | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |
| TOTAL EXECUTADO ATÉ 23/10/2025 (m²) | | | | | | | | | | 1.336,20 |

| TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) |
|------------|-----------------|-------|-------|-----------|
| 10 | 36,00 | 5,00 | 4,15 | 164,70 |
| 12 | AREA DA HACHURA | | | 113,91 |
| 13 | 41,00 | 5,30 | 3,36 | 177,53 |
| 14 | 54,00 | 4,15 | 3,36 | 202,77 |
| 15 | 51,40 | 5,25 | 4,15 | 241,58 |
| TOTAL (M²) | | | | 900,49 |

| TRECHO | h (m) | b (m) | ÁREA (m) |
|--------|-------|-------|----------|
| 15 | 5,15 | 13,5 | 34,76 |

TRIANGULO ESCALENO

| | | | | |
|---|--|--|--|----------|
| TOTAL EXECUTADO ACUMULADO ATÉ 29/10/25 (m²) | | | | 2.271,45 |
|---|--|--|--|----------|

| TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) |
|--------|----------|-------|-------|-----------|
| 16 | 40,40 | 5,25 | 5,00 | 207,05 |

| TRECHO | BALANÇAV/PISTA | h (m) | b (m) | ÁREA (m) |
|--------|----------------|-------|-------|----------|
| | | 50,00 | 4,50 | 225,00 |



| | | | | |
|---|--|--|--|----------|
| TOTAL EXECUTADO ACUMULADO ATÉ 19/11/25 (m²) | | | | 2.703,50 |
| MEDIÇÃO EVENTO 01 (m²) | | | | 1.075,55 |
| MEDIÇÃO EVENTO 02 (m²) | | | | 1.075,55 |
| MEDIÇÃO EVENTO 03 (m²) | | | | 552,40 |

| TRECHO | BALANÇAV/PISTA | C (m) | L (m) | ÁREA (m²) |
|--------|----------------|--------|-------|-----------|
| | | 177,75 | 5,00 | 888,75 |

| TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) |
|----------------------------------|----------|-------|-------|-----------|
| TRECHO FINAL A PARTIR DA ESQUINA | 8,00 | 5,20 | 5,25 | 41,80 |
| | 11,90 | 5,25 | 5,30 | 62,77 |
| | 13,20 | 5,30 | 5,50 | 71,28 |
| | 22,40 | 4,40 | 5,50 | 110,88 |
| TOTAL (M²) | | | | 286,73 |

| TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) |
|------------|----------|-------|-------|-----------|
| FAZENDA | 4,70 | 1,50 | 1,50 | 7,05 |
| | 20,40 | 4,30 | 3,23 | 76,81 |
| | 26,00 | 3,30 | 3,25 | 85,15 |
| | 24,20 | 3,85 | 3,30 | 86,52 |
| | 10,00 | 5,45 | 5,45 | 54,50 |
| | 27,90 | 4,20 | 4,10 | 115,79 |
| TOTAL (M²) | | | | 425,81 |


| | | | | |
|---|--|--|--|----------|
| TOTAL EXECUTADO ACUMULADO ATÉ 03/12/25 (m²) | | | | 4.304,79 |
| MEDIÇÃO EVENTO 01 (m²) | | | | 1.075,55 |

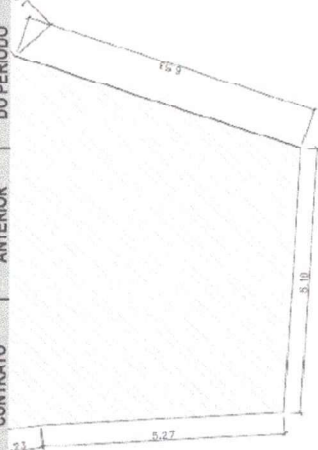

Assinado de forma digital por José Sérgio da Silva Filho
 José Pereira de Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 1404344-5



| MEMORIA DE CALCULO 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|----------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|------|--------|------|-------|------------|------|--------|--------|-----------------|------|------|-------|----|-------|------|------|--------|----|-------|------|------|--------|---|-------|------|------|--------|------------|--|--|--|----------|
| EDIFÍQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO | | | | | QUANTIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | UND | QTD | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | VALOR UNIT | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CNPJ.: 47.727.700/0001-48 | | PERÍODO: 24/12/2025 A 09/03/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DATA DA MEDIÇÃO: 09/03/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.002 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. at_09/2024 | m2 | 4.302,18 | 3.764,41 | 537,77 | 4.302,18 | R\$ 2,45 | R\$ 10.540,36 | R\$ 9.222,80 | R\$ 1.317,54 | R\$ 10.540,34 | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TRECHO</th> <th>COMPIMENTO (m)</th> <th>LARG (m)</th> <th>ÁREA (m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>54,60</td> <td>5,00</td> <td>273,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10,00</td> <td>5,76</td> <td>57,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL (m²)</td> <td></td> <td>330,60</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | TRECHO | COMPIMENTO (m) | LARG (m) | ÁREA (m²) | 1 | 54,60 | 5,00 | 273,00 | 5 | 10,00 | 5,76 | 57,60 | TOTAL (m²) | | | 330,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRECHO | COMPIMENTO (m) | LARG (m) | ÁREA (m²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 54,60 | 5,00 | 273,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 10,00 | 5,76 | 57,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (m²) | | | 330,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TRECHO</th> <th>COMP (m)</th> <th>B (m)</th> <th>b (m)</th> <th>ÁREA (m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>32,10</td> <td>5,00</td> <td>4,70</td> <td>155,89</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>65,50</td> <td>4,70</td> <td>4,50</td> <td>301,30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>13,20</td> <td>4,75</td> <td>4,70</td> <td>62,37</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50,00</td> <td>4,52</td> <td>4,10</td> <td>215,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>28,40</td> <td>4,43</td> <td>4,10</td> <td>121,13</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>31,40</td> <td>5,10</td> <td>4,43</td> <td>149,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL (M²)</td> <td></td> <td></td> <td>1.005,60</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) | 2 | 32,10 | 5,00 | 4,70 | 155,89 | 3 | 65,50 | 4,70 | 4,50 | 301,30 | 4 | 13,20 | 4,75 | 4,70 | 62,37 | 6 | 50,00 | 4,52 | 4,10 | 215,50 | 7 | 28,40 | 4,43 | 4,10 | 121,13 | 8 | 31,40 | 5,10 | 4,43 | 149,52 | TOTAL (M²) | | | | 1.005,60 |
| TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 32,10 | 5,00 | 4,70 | 155,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 65,50 | 4,70 | 4,50 | 301,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 13,20 | 4,75 | 4,70 | 62,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 50,00 | 4,52 | 4,10 | 215,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 28,40 | 4,43 | 4,10 | 121,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 31,40 | 5,10 | 4,43 | 149,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (M²) | | | | 1.005,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXECUTADO ATÉ 23/10/2025 (m²) 1.336,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TRECHO</th> <th>COMP (m)</th> <th>B (m)</th> <th>b (m)</th> <th>ÁREA (m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>36,00</td> <td>5,00</td> <td>4,15</td> <td>154,70</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>113,91</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="4">ÁREA DA HACHURA</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>41,00</td> <td>5,30</td> <td>3,36</td> <td>177,53</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>54,00</td> <td>4,15</td> <td>3,36</td> <td>202,77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51,40</td> <td>5,25</td> <td>4,15</td> <td>241,58</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL (M²)</td> <td></td> <td></td> <td>900,49</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) | 10 | 36,00 | 5,00 | 4,15 | 154,70 | 12 | | | | 113,91 | 13 | ÁREA DA HACHURA | | | | 14 | 41,00 | 5,30 | 3,36 | 177,53 | 15 | 54,00 | 4,15 | 3,36 | 202,77 | | 51,40 | 5,25 | 4,15 | 241,58 | TOTAL (M²) | | | | 900,49 |
| TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 36,00 | 5,00 | 4,15 | 154,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | 113,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ÁREA DA HACHURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 41,00 | 5,30 | 3,36 | 177,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 54,00 | 4,15 | 3,36 | 202,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51,40 | 5,25 | 4,15 | 241,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (M²) | | | | 900,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TRECHO</th> <th>h (m)</th> <th>b (m)</th> <th>ÁREA (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>5,15</td> <td>13,5</td> <td>34,76</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | TRECHO | h (m) | b (m) | ÁREA (m) | 15 | 5,15 | 13,5 | 34,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRECHO | h (m) | b (m) | ÁREA (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 5,15 | 13,5 | 34,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXECUTADO ACUMULADO ATÉ 29/10/25 (m²) 2.271,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TRECHO</th> <th>COMP (m)</th> <th>B (m)</th> <th>b (m)</th> <th>ÁREA (m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>40,40</td> <td>5,25</td> <td>5,00</td> <td>207,05</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) | 16 | 40,40 | 5,25 | 5,00 | 207,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 40,40 | 5,25 | 5,00 | 207,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>TRECHO/BALANÇ./PISTA</th> <th>h (m)</th> <th>b (m)</th> <th>ÁREA (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>50,00</td> <td>4,50</td> <td>225,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | TRECHO/BALANÇ./PISTA | h (m) | b (m) | ÁREA (m) | | 50,00 | 4,50 | 225,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRECHO/BALANÇ./PISTA | h (m) | b (m) | ÁREA (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50,00 | 4,50 | 225,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXECUTADO ACUMULADO ATÉ 19/11/25 (m²) 2.703,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIÇÃO EVENTO 01 (m²) 1.075,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

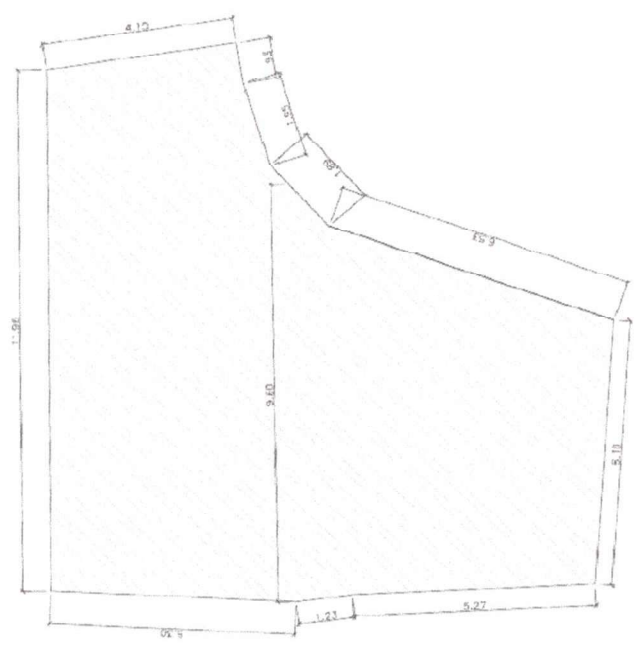

$$A = \frac{1}{2} \times b \times h$$

Assinado de forma digital por José Sérgio da Silva Filho
 José Pereira de Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SP 1404344-5

MEMÓRIA DE CÁLCULO 06


EDIFÍQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

CNPJ: 47.727.700/0001-46
 PERÍODO: 24/12/2025 A 09/03/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 09/03/2026



| ITEM | SERVIÇOS | UND | QTD | ACUMULADO ANTERIOR | QUANTIDADES | | VALOR UNIT | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO |
|------------|----------|-------|------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|----------|--------------------|------------|-------------------------|-------|
| | | | | | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | | | | | | |
| 8 | | 31,40 | 5,10 | 149,62 | | | | | | | | |
| TOTAL (M²) | | | | 1.005,60 | | | | | | | | |

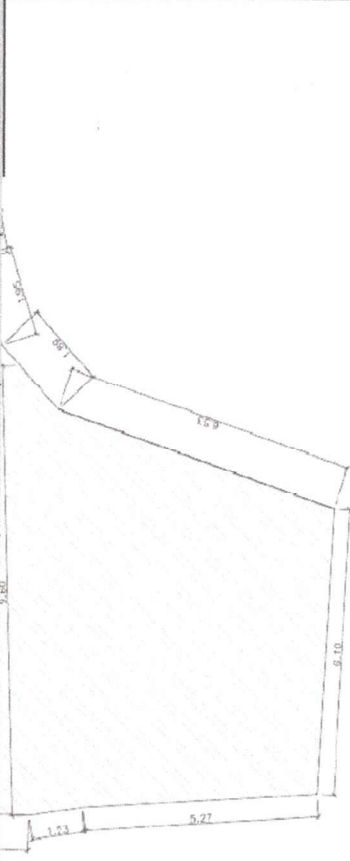

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TOTAL EXECUTADO ATÉ 23/10/2025 (m²) | 1.336,20 |
|-------------------------------------|----------|

| TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) |
|------------|-----------------|-------|-------|-----------|
| 10 | | 36,00 | 5,00 | 164,70 |
| 12 | | 41,00 | 5,30 | 113,91 |
| 13 | AREA DA HACHURA | 54,00 | 4,15 | 177,53 |
| 14 | | 51,40 | 5,25 | 202,77 |
| 15 | | | | 241,58 |
| TOTAL (M²) | | | | 900,49 |

| TRECHO | h (m) | b (m) | AREA (m) |
|--------|-------|-------|----------|
| 15 | 5,15 | 13,5 | 34,76 |

| | |
|---|----------|
| TOTAL EXECUTADO ACUMULADO ATÉ 29/10/25 (m²) | 2.271,45 |
|---|----------|

| TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) |
|--------|----------|-------|-------|-----------|
| 16 | | 40,40 | 5,25 | 590,95 |

| TRECHO | BALANÇAI/PISTA | h (m) | b (m) | AREA (m) |
|--------|----------------|-------|-------|----------|
| | | 50,00 | 4,50 | 225,00 |

| | |
|---|----------|
| TOTAL EXECUTADO ACUMULADO ATÉ 19/11/25 (m²) | 2.703,50 |
| MEDICAO EVENTO 01 (m²) | 1.075,55 |
| MEDICAO EVENTO 02 (m²) | 1.075,55 |
| MEDICAO EVENTO 03 (m²) | 552,40 |

| TRECHO | BALANÇAI/PISTA | L (m) | AREA (m²) | |
|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| | | 177,75 | 5,00 | 888,75 |

| TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) |
|----------------------------------|----------|-------|-------|-----------|
| TRECHO FINAL A PARTIR DA ESQUINA | | 8,00 | 5,20 | 5,25 |
| | | 11,90 | 5,25 | 5,30 |
| | | 13,20 | 5,30 | 5,50 |
| | | 22,40 | 4,40 | 5,50 |
| TOTAL (M²) | | | | 286,73 |

| TRECHO | COMP (m) | B (m) | b (m) | ÁREA (m²) |
|------------|----------|-------|-------|-----------|
| FAZENDA | | 4,70 | 1,50 | 7,05 |
| | | 20,40 | 4,30 | 76,81 |
| | | 26,00 | 3,30 | 85,15 |
| | | 24,20 | 3,85 | 86,52 |
| | | 10,00 | 5,45 | 54,50 |
| | | 27,90 | 4,20 | 115,79 |
| TOTAL (M²) | | | | 425,81 |

Assinado de forma digital por José Sérgio da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 171404344-5

Assinado de forma digital por José Sérgio da Silva Filho
 Dados: 2026.03.09 08:22:07 -03'00'

José Sérgio da Silva Filho

MEMÓRIA DE CÁLCULO 06

EDIFÍQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC



CNPJ: 47.727.700/0001-46
 PERÍODO: 24/12/2025 A 09/03/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 09/03/2026

| ITEM | SERVIÇOS | UND | QTD | QUANTIDADES | | VALOR UNIT | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO |
|---|------------------------|-----|-----|--------------------|-------------------------|------------|----------|--------------------|------------|-------------------------|-------|
| | | | | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | | | | | | |
| TOTAL EXECUTADO ACUMULADO ATÉ 03/12/25 (m²) | | | | | | | | | | | |
| | MEDIÇÃO EVENTO 01 (m²) | | | 4.304,79 | | | | | | | |
| | MEDIÇÃO EVENTO 02 (m²) | | | 1.075,35 | | | | | | | |
| | MEDIÇÃO EVENTO 03 (m²) | | | 1.075,35 | | | | | | | |
| | MEDIÇÃO EVENTO 04 (m²) | | | 537,77 | | | | | | | |
| | MEDIÇÃO EVENTO 05 (m²) | | | 537,77 | | | | | | | |
| | MEDIÇÃO EVENTO 06 (m²) | | | 540,38 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|----------|----------|--------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------|
| 05.001.002 | Melo-flo pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 2.151,09 | 1.882,21 | 268,88 | 2.151,09 | R\$ 39,08 | R\$ 84.064,59 | R\$ 73.556,77 | R\$ 10.507,83 | R\$ 84.064,60 | R\$ 0,00 | 0,00% |
|------------|---|---|----------|----------|--------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------|

| TRECHO | COMPRIMENTO (m) | LADOS (und) | COMP (m) | |
|-----------|-----------------|-------------|----------|--------|
| 1 | 54,80 | 2,00 | 109,20 | |
| 5 | 10,00 | 2,00 | 20,00 | |
| TOTAL (m) | | | | 129,20 |

| TRECHO | COMP | LADOS (und) | COMP (m) | |
|-----------|-------|-------------|----------|--------|
| 2 | 32,10 | 2,00 | 64,20 | |
| 3 | 65,50 | 2,00 | 131,00 | |
| 4 | 13,20 | 2,00 | 26,40 | |
| 6 | 50,00 | 2,00 | 100,00 | |
| 7 | 28,40 | 2,00 | 56,80 | |
| 8 | 31,40 | 2,00 | 62,80 | |
| TOTAL (M) | | | | 441,20 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--------|
| TOTAL EXECUTADO ATÉ 23/10/2025 (m) | | | | 570,40 |
|------------------------------------|--|--|--|--------|

| TRECHO | COMP | LADOS (und) | COMP (m) | |
|-----------|-------|-------------|----------|--------|
| 10 | 36,00 | 2,00 | 72,00 | |
| 12 | 29,76 | 1,00 | 29,76 | |
| 13 | 41,00 | 2,00 | 82,00 | |
| 14 | 54,00 | 2,00 | 108,00 | |
| 15 | 51,40 | 2,00 | 102,80 | |
| 16 | 56,00 | 2,00 | 112,00 | |
| TOTAL (M) | | | | 506,56 |

| TRECHO | COMP (m) | LADOS (und) | COMP (m) | |
|----------------|----------|-------------|----------|--------|
| 16 | 40,40 | 2,00 | 80,80 | |
| BALANÇAV PISTA | 100,00 | 2,00 | 200,00 | |
| TOTAL (M) | | | | 280,80 |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------|
| TOTAL EXECUTADO ACUMULADO ATÉ 29/10/25 (m) | | | | 1.357,76 |
|--|--|--|--|----------|

Jose Pereira de Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 271404344-5

Assinado de forma digital
 por José Sérgio da Silva
 Filho
 Dados: 2026.03.09
 08:22:27 -03'00'

José Sérgio da Silva Filho

MEMÓRIA DE CÁLCULO 06



47.727.700/0001-46

CNPJ:

24/12/2025 A 09/03/2025

PERÍODO

09/03/2026

DATA DA MEDIÇÃO:

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

| ITEM | SERVIÇOS | UND | QTD | QUANTIDADES | | | | VALORES | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|----------|--------------------|------------|-------------------------|------------|----------|--------------------|------------|-------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | VALOR UNIT | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO | | | | | | | | |
| TRECHO BALANÇEA/PISTA | COMP (m) | LADOS (und) | COMP (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 77,75 | 3,00 | 233,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRECHO BALANÇEA/PISTA | COMP (m) | LADOS (und) | COMP (m) | 100,00 | 1,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 333,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRECHO COMP (m) | LADOS (und) | COMP (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8,00 | 3,00 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRECHO FINAL A PARTIR DA ESQUINA | COMP (m) | LADOS (und) | COMP (m) | 11,90 | 3,00 | 35,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13,20 | 3,00 | 39,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 33,40 | 3,00 | 100,20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 199,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRECHO FINAL | COMP (m) | LADOS (und) | COMP (m) | 91,50 | 3,00 | 274,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 274,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (M) | | | | | | 274,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (m) | | | | | | 2.165,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIÇÃO EVENTO 01 | | | | | | 637,77 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIÇÃO EVENTO 02 | | | | | | 637,77 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIÇÃO EVENTO 03 | | | | | | 268,89 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIÇÃO EVENTO 04 | | | | | | 268,89 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIÇÃO EVENTO 05 | | | | | | 268,89 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIÇÃO EVENTO 06 | | | | | | 282,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.001.003 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material a distância até 10km | m | 717,03 | 358,52 | 717,03 | 11,07 | 717,03 | 3.968,82 | 7.937,53 | 3.968,71 | 7.937,52 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| REFERENTE A 50% DO ESCORAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.001.004 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 19,20 | - | 19,20 | 62,87 | - | - | 1.207,10 | 1.207,10 | 1.207,10 | - | 0,00% | | | | | | | |
| 19,20m AO LONGO DA PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.002 | PASSEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.002.001 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos, at 09/2024 | m2 | 860,44 | 430,22 | 860,44 | 2,45 | 2.108,08 | 1.054,04 | 2.108,08 | 1.054,04 | 2.108,08 | - | 0,00% | | | | | | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | 430,22 | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRIMENTO RESTANTE | | | | | | 430,22 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | | | | | | 860,44 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIÇÃO 06 | | | | | | 787,42 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado de forma digital por
 José Sérgio da Silva Filho
 Dados: 2026.03.09 08:22:53

Assinado de forma digital por
 José Sérgio da Silva Filho
 Dados: 2026.03.09 08:22:53

Assinado de forma digital por
 José Sérgio da Silva Filho
 Dados: 2026.03.09 08:22:53

Assinado de forma digital por
 José Sérgio da Silva Filho
 Dados: 2026.03.09 08:22:53

Assinado de forma digital por
 José Sérgio da Silva Filho
 Dados: 2026.03.09 08:22:53

MEMÓRIA DE CÁLCULO 06

EDIFÍQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC



CNPJ: 47.727.700/0001-46

PERÍODO: 24/12/2025 A 09/03/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 09/03/2026

| ITEM | CONTRATO | | | | QUANTIDADES | | | | VALORES | | | |
|------------|--|--------|----------|--------------------|-------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------|----------|
| | SERVIÇOS | UND | QTD | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | VALOR UNIT | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO |
| 05.002.002 | Atorro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | m3 | 43,02 | 21,51 | 21,51 | 43,02 | R\$ 119,98 | R\$ 5.161,54 | R\$ 2.580,77 | R\$ 2.580,77 | R\$ 5.161,54 | R\$ 0,00 |
| MEDIÇÃO | COMPRIMENTO | LARG | ALT | VOLUME (m³) | | | | | | | | |
| 5 | | 419,00 | 1,20 | 0,05 | 25,14 | | | | | | | |
| 6 | | 298,00 | 1,20 | 0,05 | 17,88 | | | | | | | |
| | TOTAL EXECUTADO (m³) | | | | 43,02 | | | | | | | |
| 05.002.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana (pavimentada, dimt até 30 km (unidade: m3xkm), af_07/2020 | m3xkm | 1.290,65 | 645,33 | 645,32 | 1.290,65 | R\$ 2,88 | R\$ 3.717,07 | R\$ 1.858,55 | R\$ 1.858,52 | R\$ 3.717,07 | R\$ 0,00 |
| MEDIÇÃO | COMPRIMENTO | LARG | ALT | VOLUME (m³) | DIST | TOTAL | | | | | | |
| 5 | | 419,00 | 1,20 | 0,05 | 25,14 | 30,00 | 754,20 | | | | | |
| 6 | | 298,00 | 1,20 | 0,05 | 17,94 | 30,00 | 538,20 | | | | | |
| | TOTAL (m3xkm) | | | | | 1.292,40 | | | | | | |
| 05.002.004 | Execução de passeto (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado, af_08/2022 | m3 | 43,02 | 21,51 | 21,51 | 43,02 | R\$ 683,62 | R\$ 29.409,34 | R\$ 14.704,67 | R\$ 14.704,67 | R\$ 29.409,33 | R\$ 0,00 |
| MEDIÇÃO | COMPRIMENTO | LARG | ALT | VOLUME (m³) | | | | | | | | |
| 5 | | 419,00 | 1,20 | 0,05 | 25,14 | | | | | | | |
| 6 | | 298,00 | 1,20 | 0,05 | 17,88 | | | | | | | |
| | TOTAL EXECUTADO (m³) | | | | 43,02 | | | | | | | |
| 05.002.005 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto, af_04/2022 | m2 | 860,44 | 430,22 | 430,22 | 860,44 | R\$ 4,44 | R\$ 3.820,36 | R\$ 1.910,18 | R\$ 1.910,18 | R\$ 3.820,35 | R\$ 0,00 |
| MEDIÇÃO | COMPRIMENTO | LARG | ÁREA | | | | | | | | | |
| 5 | | 419,00 | 1,20 | 502,80 | | | | | | | | |
| 6 | | 298,00 | 1,20 | 357,60 | | | | | | | | |
| | TOTAL (m²) | | | 860,44 | | | | | | | | |
| 05.002.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm | m2 | 215,11 | 107,56 | 107,56 | 215,11 | R\$ 31,46 | R\$ 6.767,36 | R\$ 3.383,64 | R\$ 3.383,52 | R\$ 6.767,36 | R\$ 0,00 |
| MEDIÇÃO | COMPRIMENTO | LARG | ÁREA | | | | | | | | | |
| 5 | | 419,00 | 0,30 | 125,70 | | | | | | | | |
| 6 | | 298,00 | 0,30 | 89,41 | | | | | | | | |
| | TOTAL (m²) | | | 215,11 | | | | | | | | |
| 05.002.007 | Piso látil direcional e de alétra, em concreto colorido, picfeicientes visuais, dimensões 30x30cm aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 215,11 | 107,56 | 107,56 | 215,11 | R\$ 154,94 | R\$ 33.329,15 | R\$ 16.665,35 | R\$ 16.663,80 | R\$ 33.329,14 | R\$ 0,00 |
| MEDIÇÃO | COMPRIMENTO | LARG | ÁREA | | | | | | | | | |
| 5 | | 419,00 | 0,30 | 125,70 | | | | | | | | |
| 6 | | 298,00 | 0,30 | 89,41 | | | | | | | | |
| | TOTAL (m²) | | | 215,11 | | | | | | | | |

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva Filho
Dados: 2026.03.09 08:23:15

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva Filho
Dados: 2026.03.09 08:23:15

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva Filho
Dados: 2026.03.09 08:23:15

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva Filho
Dados: 2026.03.09 08:23:15

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva Filho
Dados: 2026.03.09 08:23:15

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva Filho
Dados: 2026.03.09 08:23:15

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva Filho
Dados: 2026.03.09 08:23:15

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva Filho
Dados: 2026.03.09 08:23:15

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva Filho
Dados: 2026.03.09 08:23:15

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva Filho
Dados: 2026.03.09 08:23:15

MEMÓRIA DE CÁLCULO 06

EDIFÍQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - CT 59/2025 PMGC

CNPJ.: 47.727.700/0001-48

PERÍODO: 24/12/2025 A 09/03/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 09/03/2026



| ITEM | SERVIÇOS | UND | QTD | QUANTIDADES | | | VALORES | | | | | | |
|---|--|-----|----------|--------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------|-------|
| | | | | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | DO PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO | | |
| 05.002.008 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de atelal/direcional. | un | 15,00 | 8,00 | 7,00 | 15 | R\$ 553,74 | R\$ 8.306,10 | R\$ 4.429,92 | R\$ 3.876,18 | R\$ 8.306,10 | R\$ - | 0,00% |
| 07 UNIDADES AO LONGO DA PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 05.003 | SINALIZAÇÃO | | | | | 0 | R\$ - | R\$ 4.477,74 | R\$ - | R\$ 4.477,74 | R\$ 4.477,74 | R\$ - | 0,00% |
| | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 3,00 | - | 3,00 | 3 | R\$ 750,53 | R\$ 2.251,59 | R\$ - | R\$ 2.251,59 | R\$ 2.251,59 | R\$ - | 0,00% |
| 03 UNIDADES "PARE" AO LONGO DA PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 05.003.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 3,00 | - | 3,00 | 3 | R\$ 742,05 | R\$ 2.226,15 | R\$ - | R\$ 2.226,15 | R\$ 2.226,15 | R\$ - | 0,00% |
| 03 UNIDADES "40km/h" AO LONGO DA PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | MARCO INAUGURAL | | | | | 0 | R\$ - | R\$ 3.309,14 | R\$ - | R\$ 3.309,14 | R\$ 3.309,14 | R\$ - | 0,00% |
| | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0,28 | - | 0,28 | 0,28 | R\$ 2.921,01 | R\$ 817,88 | R\$ - | R\$ 817,88 | R\$ 817,88 | R\$ - | 0,00% |
| 01 UND DE MARCO INAUGURAL PADRÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 06.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1,00 | - | 1,00 | 1 | R\$ 2.491,26 | R\$ 2.491,26 | R\$ - | R\$ 2.491,26 | R\$ 2.491,26 | R\$ - | 0,00% |
| 01 UND | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | 0 | R\$ - | R\$ 21.525,26 | R\$ - | R\$ 21.525,26 | R\$ 21.525,26 | R\$ - | 0,00% |
| | Pintura de meio fio (caliação) | m | 1.434,06 | - | 1.434,06 | 1.434,06 | R\$ 5,11 | R\$ 7.328,05 | R\$ - | R\$ 7.328,05 | R\$ 7.328,05 | R\$ - | 0,00% |
| PINTURA DO MEIO FIO AO LONGO DA PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 07.002 | Limpeza geral | m2 | 5.162,62 | - | 5.162,62 | 5.162,62 | R\$ 2,75 | R\$ 14.197,21 | R\$ - | R\$ 14.197,21 | R\$ 14.197,21 | R\$ - | 0,00% |
| LIMPEZA GERAL DA PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | R\$ 790.188,13 | R\$ 624.022,81 | R\$ 166.165,32 | R\$ 790.188,13 | R\$ 790.188,13 | R\$ - | 0,00% |

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho
Dados: 2026.03.09 08:23:36
-03'00'

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho

Assinado de forma digital
por José Sérgio da Silva
Filho
